

# 令和元年 主要港督励巡視

沿岸班 結果報告



7月24日(火)  
神奈川県/横浜港



7月25日(水)  
愛知県/名古屋港



7月26日(木)  
兵庫県/神戸港



7月27日(金)  
福岡県/博多港

兵庫県総支部/近藤 和則

# 令和元年7月23日(火) 横浜港


巡視先: 本牧埠頭B-5~B-8

発表 / 兵庫県総支部  
 書記 / 東北総支部

## <良かった点>

### (B-5) 日本国際輸送(株)

- ・KYボード、熱中症の注意喚起掲示物良好
- ・玉掛道具の整理整頓及びメンテ良好

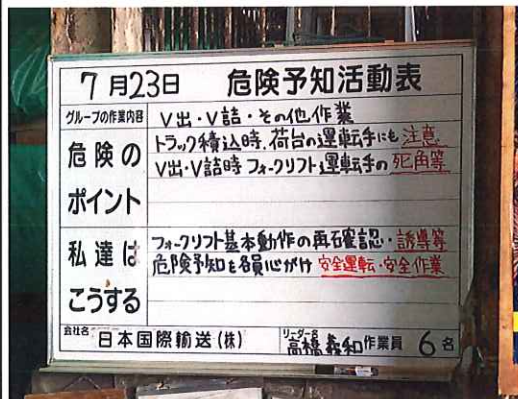

(KYボード)



(温度計)

### (B-6) 白鳥運輸(株)


- ・フォークリフト作業時、運転手と手元作業者の連携良好
- ・歩行帯の表示、荷役道具類の整理整頓、カーブミラーの設置、梯子の固縛、消火栓・消火器の配置図、KYボード  
 温度計、シャッターの幅高さ表示良好



(歩行帯)



(カーブミラー設置)

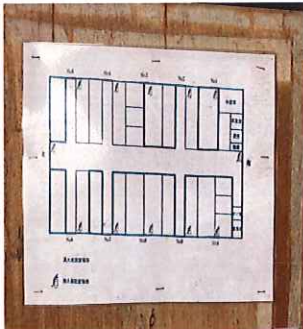

(消火栓・消火器  
配置図)



(梯子固縛)



(速度表示・シャッター  
の幅高さ表示)

### (B-7) (株)山九

- ・事故事例の掲示、音声センターによる注意喚起、大きなカーブミラー、スポットクーラー、熱中症に対する  
 掲示(一定時間毎に手書きで表示)、コンテナ固縛良好、資材置き場の整理整頓良好



(事故事例表示)



(カーブミラー設置)



(熱中症対策)



(資材置き場)

(B-8) 丸全港運(株)  
熱中症対策、整理整頓良好



(各社)  
貨物の角に注意喚起の看板設置良好



<その他 良かった点>

(B-6) 白鳥運輸(株)



(KYボード他表示物良好)



(ポスター表示物良好)

(B-7) (株)山九



(安全衛生推進者の職務  
はい作業主任者の職務有り良好)

<指摘事項及び改善事項>

(B-5) 日本国際輸送(株)

(指摘) エアホースを片付けずに放置

(回答) 早急に是正し今後、一作業一片付けを徹底していきます。

(改善) コンセント差込口が下を向いて路面スレスレだったので漏電の危険有り

(回答) コンセントが垂れ下がらないように工夫します。

(B-6) 白鳥運輸(株)

(改善) 屋外地面設置の鉄板の跳ね上がりあり。地盤からの改良が必要では？

(回答) 地盤の改良は難しいと思われまして、鉄板により改善します。

(B-7) (株)山九海陸

(改善) 路面標示がほぼ消えかかっているのを、養生をお願いします。

(回答) 半年に一度書き直ししているが、今後適宜書き直しをする。

(B-8) 丸全港運(株)

(指摘) フォークリフトの爪の上まで廃フレコンが覆い被さっているのを早急に処分する様をお願いします。


(回答) 適宜4sを徹底します。

(改善) 他社に比べて表示物が少ない。

(回答) 早急に改善します。

(改善) KYボードはプリントではなく直接書いたのが見やすいのでは？

(回答) 早急に改善します。

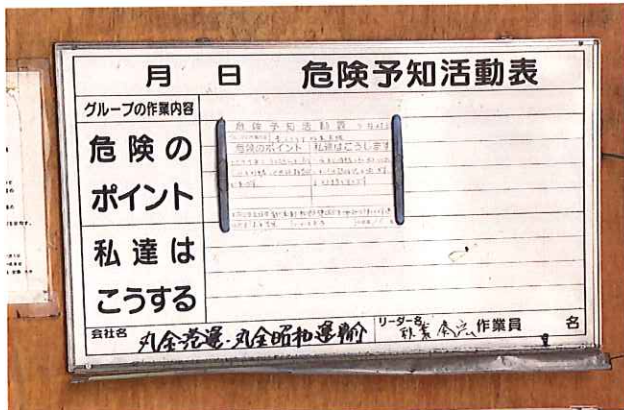

(KYボード)



(表示物が少ない)

#### <質問事項>

全体

(質問) 熱中症の基準値をオーバーした時の対処方法は？

(回答) ・(各社) こまめな水分補給及び小休憩をとる。  
・(各社) 体調に異変を感じた時は、速やかに班長または作業責任者に伝え対処する。

(B-7) (株)山九海陸

(質問) 木箱が高積みしてあったが基準はありますか？

(回答) ・貨物に見合った段積みをしています。  
・貨物が丈夫でなければ段積みは行わない。

# 令和元年7月24日(水) 名古屋港

巡視先:名古屋港国際総合流通センター

発表 / 四国総支部  
書記 / 神奈川総支部

## <良かった点>

(各店社)

安全掲示物、服装、熱中症対策、フォークリフト4原則、地切り表示良好



(三菱倉庫/菱洋運輸)



(東陽倉庫/東洋物流)



(旭運輸/新興海運)

株)フジトランスコーポレーション

・緊急連絡網が整備されており良好

東陽倉庫(株)/東陽物流(株)

・フレコン作業時、適切なアタッチメントを使用し良好

伊勢湾海運(株)・名港海運(株)・旭運輸(株)

・コンテナ作業時、大型のスポットクレーンを使用しており良好



(伊勢湾海運)



(名港海運)



(旭運輸/新興海運)

伊勢湾海運(株)・(株)フジトラストコーポレーション・旭運輸(株)  
・コンテナ作業中及び作業終了の看板表示あり良好



(伊勢湾海運)



(フジトラストコーポレーション)



(旭運輸/新興海運)

旭運輸(株)/新興海運(株)  
・熱中症対策と共にタンカを設置有り良好



・歩行帯に可動式の一旦停止バーを設置しており良好

<その他 良かった点>

(株)上組  
AEO掲示板有り良好



東海協和(株)・伊勢湾海運(株)・三井倉庫(株)・旭運輸(株)  
避難経路図有り良好

東海協和(株)・伊勢湾海運(株)・(株)フジトラストコーポレーション  
名港海運(株)・三井倉庫(株)・東陽倉庫(株)・三菱倉庫(株)  
消火栓、消火器配置図有り良好

(株)フジトランスコーポレーション  
倉庫出入り口カーブミラー設置有り良好



伊勢湾海運(株)  
AED設置有り良好



<指摘事項及び改善事項>

伊勢湾海運(株)・東陽倉庫(株)

(指摘) 指差しは出来ていたが荷から目を離すのが早かった。

(回答) 早急に是正する。

(株)上組

(指摘)

- ・オムニ下など清掃が行き届いてなかった。
- ・非常ベルの前に使用済みストレッチフィルムなどのごみが置かれていた。
- ・歩行帯に貨物が置かれていた。

(回答) 全て早急に是正する。



(非常ベル)



(歩行帯に貨物)

伊勢湾海運(株)

(改善) 通行帯の表示が薄くなっている。

(回答) 早急に改善する。

(指摘) 歩行帯にコードあり。

歩行帯に貨物あり。

(改善) 「止まれ」表示が黒ずんでいた。

(回答) 全て早急に是正する。

三菱倉庫(株)/菱洋運輸(株)

(指摘) 歩行帯に貨物あり。

(回答) 早急に是正する。

<質問事項>

(株)上組

(質問) パレット段数が34段となっておりますが指定の段数はありますか？

(回答) 高さ30段と取り決めているので早急に是正する。

東陽倉庫(株)/東洋物流(株)

(質問) 降雨時フレコンバックのトラック積み卸し作業はどの様になっていますか？

(質問) 片方ずつの積み込みで対応しています。



# 令和元年7月25日(木) 神戸港

巡視先:新港突堤西地区/港湾技能研修センター(見学)

発表 / 千葉総支部  
書記 / 沖縄総支部

## <良かった点>

### 三井倉庫(株)/神戸サンソー港運(株)

- ・4s非常に良好。
- ・フォークリフト5原則良好。
- ・挨拶が非常に良好。
- ・進行方向への確実な指先呼称がされており良好。
- ・清掃道具の定置定数管理がしっかりされており良好。



(清掃道具置き場)



(指差呼称)

- ・熱中症対策のドリンクのそばに誰もが気兼ねなく飲めるように紙コップが設置されており良好。
- ・KYボード、作業計画書、熱中症警戒表示が一か所にまとめられて分かりやすく表示されており良好。



(熱中症対策非常に良好)



- ・コンテナ出バン作業員とリフトマンの合図確認連携が確実に取れており良好。
- ・はい付け状態良好。(ひな段にてはい付け)
- ・職員(三井倉庫)の方がベルをぶら下げて歩行し作業員に対して自分の存在を分かりやすくしており良好。

## <指摘事項及び改善事項>

特になし

<質問事項>

(質問) 自動ラップ巻き機の使用にあたる注意事項を教えてください。  
(自動ラップ巻き機の操作者として)

(回答) 1.周囲の安全確認を行う。  
2.操作者の立ち位置を決めラップ巻き込み防止を行う。  
3.非常時には、操作盤の非常停止ボタンを押す。

(提案) 電気リフトの電源ケーブルの管理方法を統一したのが良いのでは？

(回答) 電気リフトの電源ケーブルの管理方法は、フックに掛ける方向でします。

(提案) 倉庫出入り口に停止線やカーブミラーの設置があった方が良いのでは？

(回答) 停止線やカーブミラーの設置については、元請けの三井倉庫と相談し、設備投資を検討します。

港湾技能研修センター(見学)



# 令和元年7月26日(金) 博多港

発表 / 東北総支部  
書記 / 東海総支部

巡視先: 箱崎埠頭/アイランドシティ倉庫

## <良かった点>

山九(株)

・トラック運転手用の安全対策が良好。



(安全帯)



(昇降階段)

・フォークリフトの安全対策が良好。



(LEDで照射)




(マイク)

(マイク設置)

・コンテナ作業に照明が設置されており良好。

・各作業所ごとにKYボードが設置されており良好。

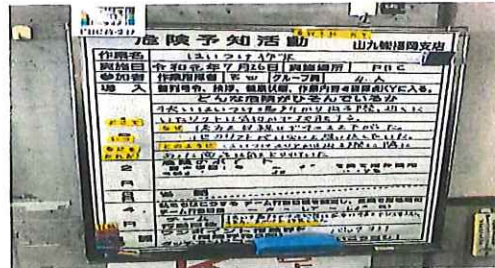


相互運輸(株)

- ・消火器・消火栓の表示が高い位置にあり視認性が良好。
- ・フォークリフト停止5原則のシールが工夫されており良好。
- ・AEDの設置場所が明確で良好。



(消火器表示)

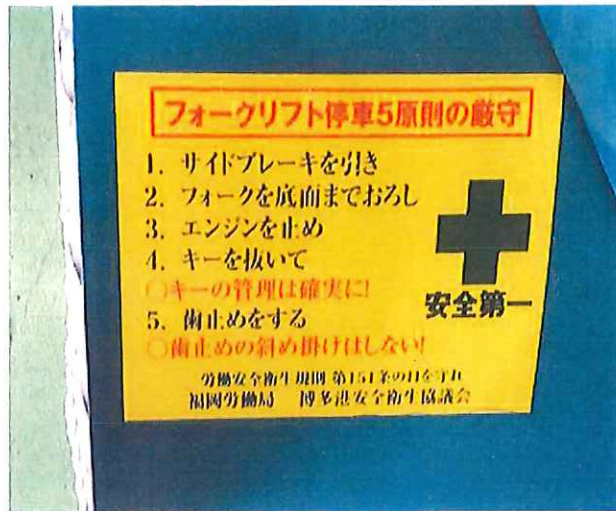

(4と5が工夫されている)

<その他 良かった点>

山九(株)



(熱中症対策)



(転落防止柵)



(カーブミラー設置)

相互運輸(株)



(道具類 整理整頓)

元年 7月26日 危険予知活動表	
グループの作業内容	予バン バンニング 入庫
危険のポイント	気温の高い場所作業による熱中症の発生 クラン作業時のハッチで作業が完了する
注意するポイント	クランが吊り下げた荷物の高さを見失う クランの動きを止める方法を失う
私達はこうする	事前に作業範囲を確認し、クランの動きを確認する クランを使用するにあたっては作業範囲を確認する
相互運輸株式会社	中村 後藤 吉住

(KYボード)

<指摘事項及び改善事項>

山九(株)

- (指摘) ・消火栓扉の前にキャスター付きのゴミ箱が置いてあった。  
・箒、塵取りが壁に立てかけてあり、倒れる危険があった。

(回答) 所定の場所に戻します。



相互運輸(株)

(指摘) 丸のこが通行帯付近に置かれていた。

(回答) 使用後、所定の場所に戻します。

<質問事項>

山九(株)

(提案) フォークリフト充電用の電源扉の固定方法を統一された方が良いのでは？

(回答) ゴムバンドを使い固定する。

相互運輸(株)

(提案) 昇降台に手すりを設置した方がより安全ではないのでしょうか？

(回答) 幅が広く手すりの付いている物に取り替えていきます。

(質問) 沿岸荷役主任者、作業主任者は腕章を付けないのでしょうか？

(回答) 腕章を付ける様に指導していきます。
